

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年03月08日

計画の名称	都市公園の整備による安全・安心なまちづくり(防災・安全)												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○	
交付対象	高石市												
計画の目標	地域防災計画において避難所に位置づけられる公園を整備し、災害発生時に活用することにより、地域の防災力を高め安全・安心なまちづくりを目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,456	A	2,456	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		平成31年度	令和3年度	令和5年度
1	地域防災計画において、防災機能を備えた蓮池公園を整備し、災害時に避難可能となる人数を4813人増加する。 地域防災計画により位置つけた都市公園を整備し、災害時においても円滑に避難できる人数の増加。 9,626(m <sup>2</sup> )【公園内の避難可能区域の面積】/2.0(m <sup>2</sup> /人)【1人あたりに必要な避難面積】	0人	0人	4813人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
(高石市国土強靱化地域計画)に基づき実施される要素事業:A12-001																

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	高石市	直接	高石市	-	-	都市公園事業(蓮池公園)	施設整備(野球場・園路・駐車場外)S=4.0ha	高石市						2,456	3.20	-	
												小計						2,456		
												合計						2,456		


事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 高石市にて実施	事後評価の実施時期 令和5年度
	公表の方法 高石市ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	必要面積の8割を超える用地を確保したところであり、供用開始に伴い効果発現が見込まれる。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
第2期社会資本総合整備計画に移行し、用地取得を進めるとともに、防災機能を備えた公園の早期完成に取り組んでいく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	4813人
	最終実績値	0人
	災害時において避難可能となる人数の増加。	
	一部において、用地取得が難航し、事業進捗に遅れが生じたため。	

参考図面 (防災安全交付金)

計画の名称	都市公園の整備による安全・安心なまちづくり(防災・安全)	交付対象	大阪府高石市
計画の期間	平成31年度 ~ 平成35年度 (5年間)		

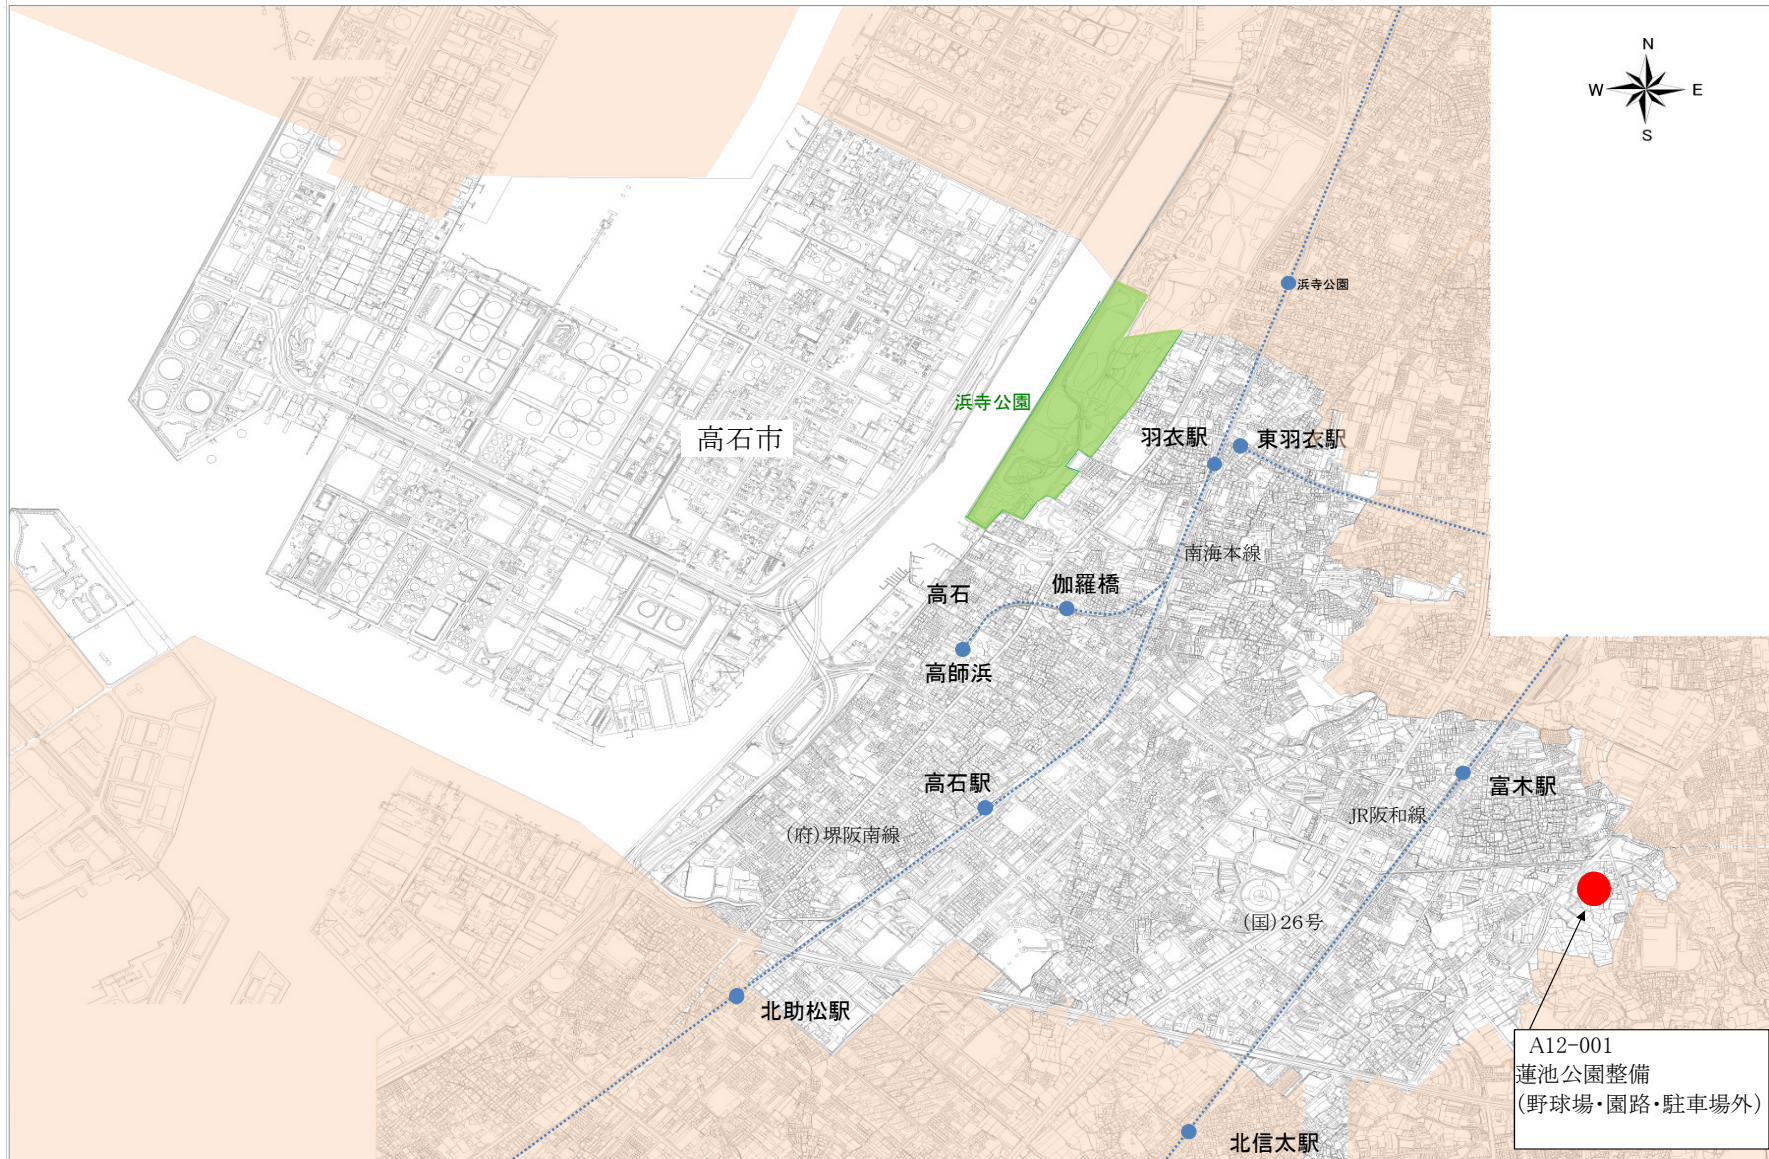

A12-001  
 蓮池公園整備  
 (野球場・園路・駐車場外)
